



Beter Zeker
Bien Sûr

ONTWERP, VERBODEN, MONITORING, EXPLORATIE
ELECTRIEKE INSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10s006 of 10s008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Vlaams-Brabant, Betekomsestraat 98A, 3128 TREMELO
T: 016 63 47 45, E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be


Verslagnummer: 0209-160720-01_01 Datum van het onderzoek: 20/07/2016
Extra controle datum:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE:

DORPSSTRAAT 11
3040 NEERLISE

Visualisatie van de installatie

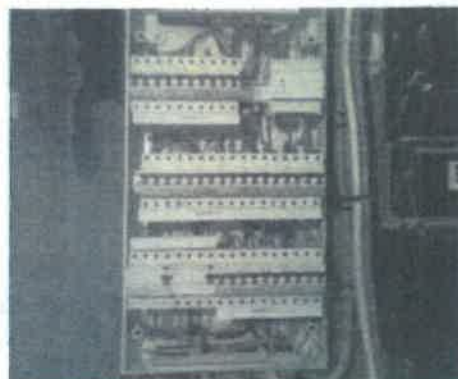

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

EAN: Teller nr. 58511088 Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Nieuwe installatie /	Type der Lokalen:	wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie:	Na 01/10/81
Aansluiting spanning:	3x230V	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	32 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type:	4p 40A/300mA
Aantal borden:	1	Aantal eindstroombenen:	18
Uitwendige invloedsfactoren:	geen	Schema:	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens: AREI art. 270,
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 10 Ohm RI tot 1,5 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendradischema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De eéndrads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/07/2041 (art. 271 ARE) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0209 PIETER SPAPEN

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de afwerking van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (veestellingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelkasten, ...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij raakcontacten en overstromingsbescherming;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroomverrichingen via de eigen aansluiting;
 - e) de controle van de foutkassen en de juiste aansluiting van de differentieelstroomverrichingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de aanwezigheid van de noodzakelijke verbindingen (fase-, en nulcontact) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgemonte of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Besondere instructies, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsverrichingen tegen overstromen en de doormaten van de respectievelijke stroomdraden die ze beschermen.

Plichten van de eigenaars, beheerders, huurders

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de eendradischema's en de situatieschema's;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangegeven aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie zeker zijn bevestigdheid heeft overtuigd in te lichten over elk ongeval van personen overkomen en schade van of overstromingen te wijten aan de aanwezigheid van elektrische installatie;
- d) de verplichting, wanneer er overstromingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van een jaar de overstromingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overstromingen overblijven, moet het erkend organisme aan kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die bevoegd is met het hoogste niveau op de huishoudelijke elektrische installaties.

Bewaren van de nota's: betrof het gebieden die geen invloed hebben op de installatie, veranderingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gewaar instaan voor de veiligheid, of organisatiegegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 20/07/2041.

STAP 4

BTV Vlaams-Brabant staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

